從程式建置到受控部署
建立可追蹤的換版流程

Windows 自動化部署實作計畫

GitLab 建置 → Azure DevOps Server 管理放行

正式換版，由授權部門掌握。



Express 作為 POC 起點

預計 12/28 前完成

讓換版不再每次重新摸索

完成導入並通過驗收後，預期帶來三項改善



01

維運更一致

一致流程，少搬檔、少漏步。

人員、時間、主機與版本
可追查。



02

降低操作風險

版本與目標綁定放行。

備份與復原演練，
降低失敗影響。



03

複用到其他專案


留下治理與操作範本。

各專案的服務與復原方式，
仍需個別驗證。

預期改善，不是既有成果；POC / 試辦後再以紀錄比較。

從程式碼出發，在放行後抵達正式環境

端到端目標架構 / 待 POC：建置、版本管理與正式部署，各自守住責任邊界。

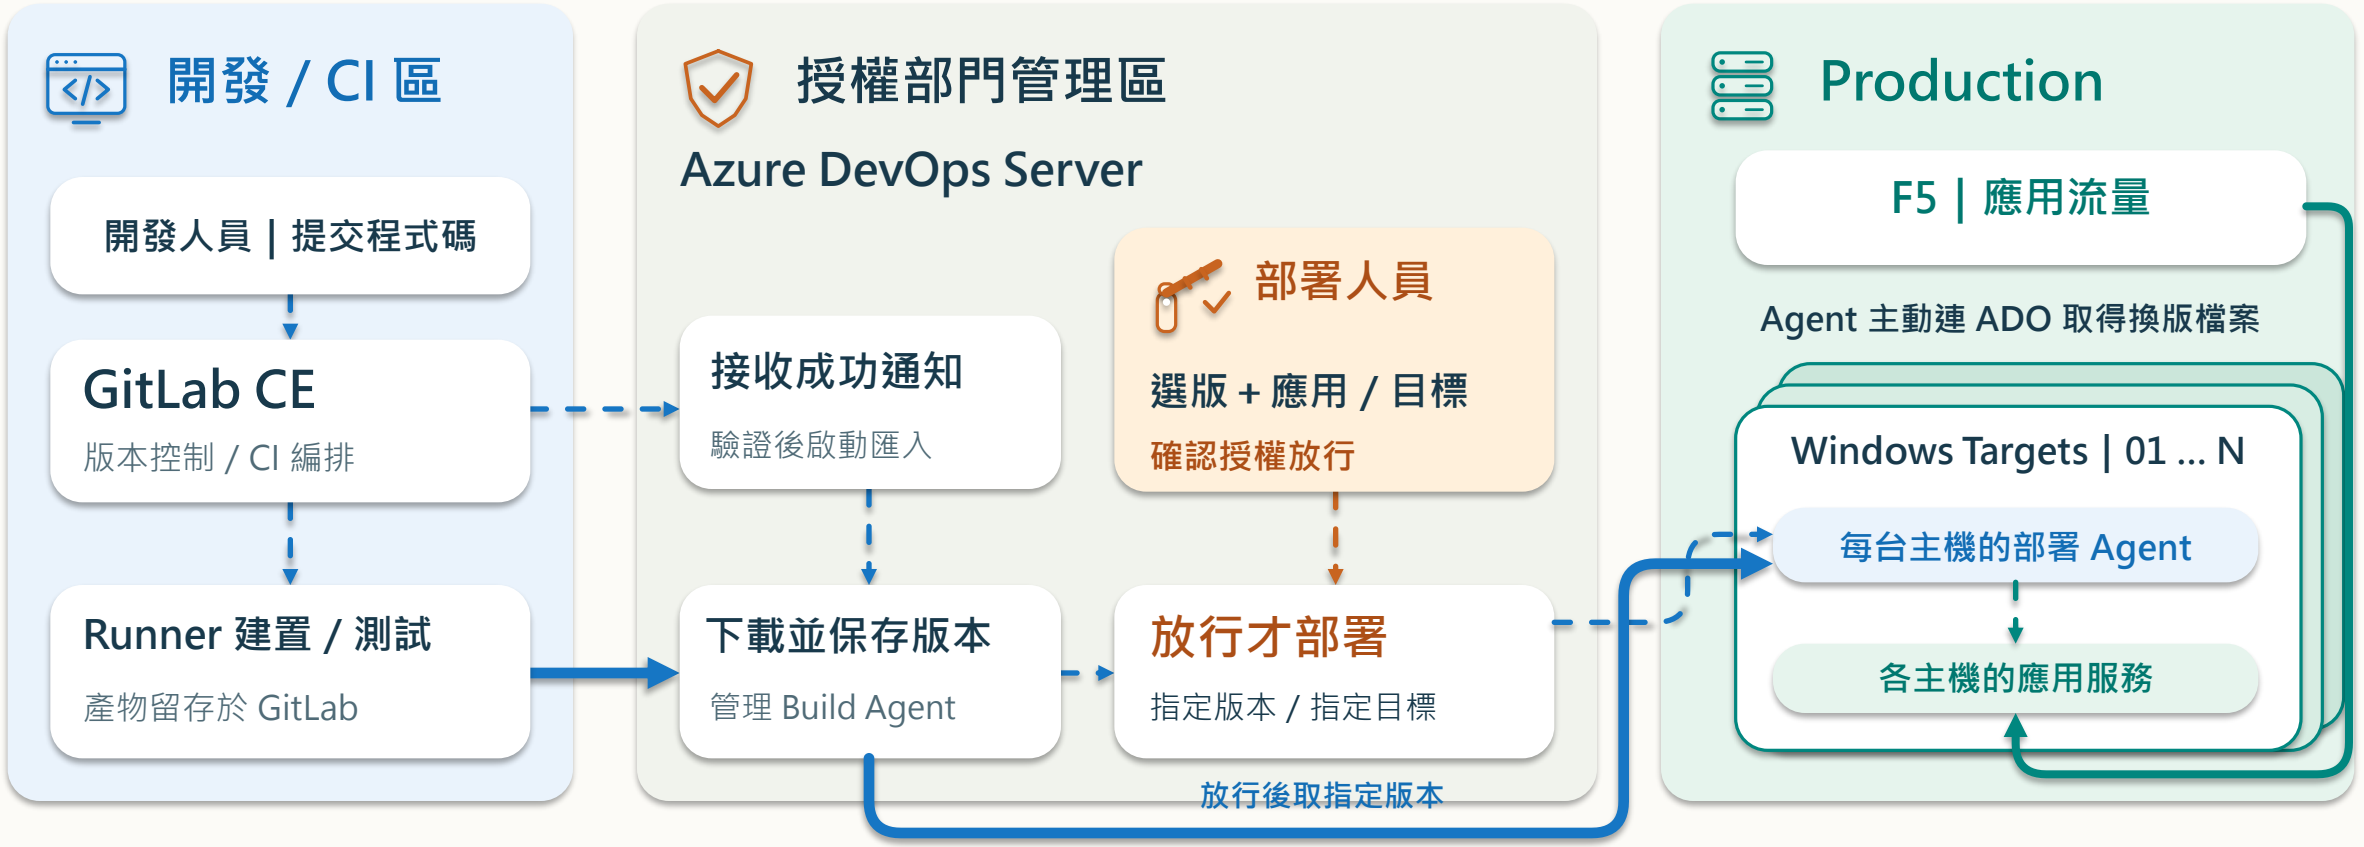

不同 branch，各走合適的部署路線


規劃示意 / 待 POC：各分支各自建置；正式部署仍須授權。

來源分支	觸發與策略	執行者	目標環境
master	符合條件自動觸發	Azure DevOps Server + Agent	SIT
pre-production	符合條件自動觸發	Azure DevOps Server + Agent	UAT
production / production-bq1 production-bq2 / production-nh …	選版 + 選目標 授權放行	Azure DevOps Server + Agent 依目標採不同換版策略	Production

不同分支可有不同 pipeline；不將 production 前綴自動視為已授權。

放行後才送檔，流量恢復前再確認

規劃 / 待 POC：Agent、備份、人工等待與復原腳本均須實作及演練。

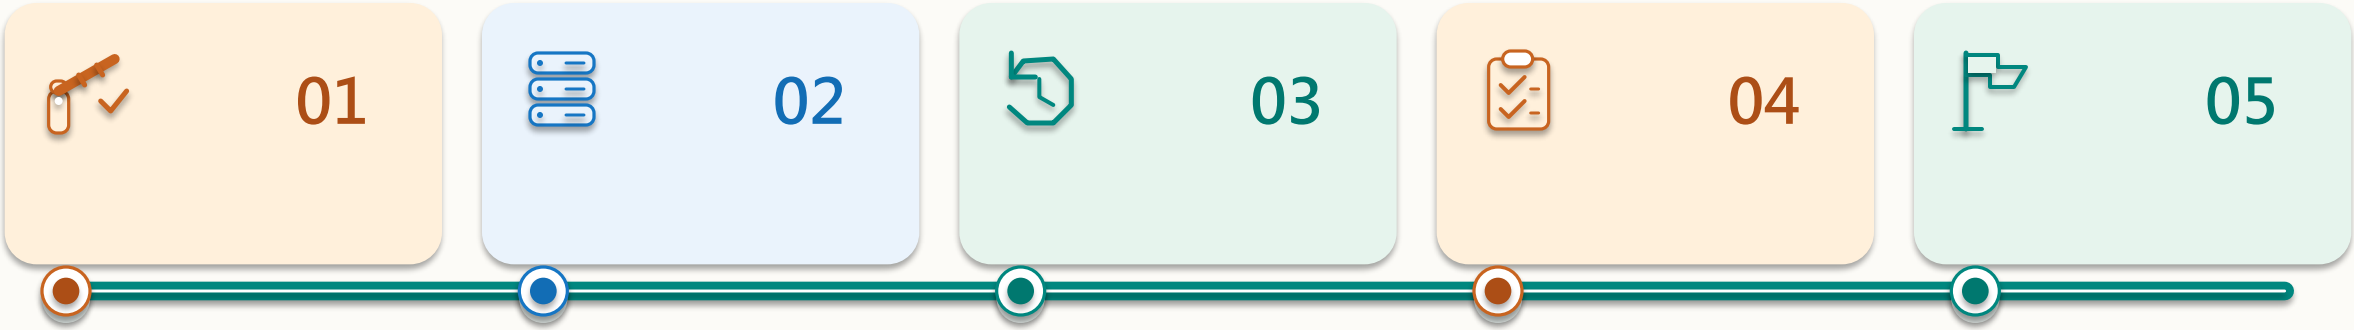

換版 / 啟動 / 檢查 / 新版功能驗證失敗

保持隔離 → 還原舊版 → 再檢查

舊版健康且人工確認，才可上 F5。
復原成功仍記為「換版失敗」。

未確認、逾時或復原失敗：不恢復流量

停止後續目標並通知；主機失聯另需復原手段。

從第一個 POC，走向受控的正式上線

暫定里程碑順序；階段日期、資源與上線批准，待相關部門共同確認。



POC & 跨部門討論

(10/12 ~ 10/23)

驗證架構可行性

協調架構部門

安裝 / 配置 Azure DevOps

串接 CI/CD Pipeline

以 雷影 系統為首發驗證標的

SIT & UAT 驗測

整合與例外測試

Production 正式環境

依程序取得核准後試辦上線

後續發展

陸續串接其他專案

實現可複製的自動化換版

- 本輪預計 12/28 前完成

後續發展：逐案擴展，時程另議
