另一種設計提案

保留建置的效率，
走向受控的正式部署。

Windows 正式部署治理計劃

GitLab 建置 → Azure DevOps Server 管理放行

正式換版，由授權部門掌握。



Express 作為 POC 起點

目標 12/31 · 待共同確認

六個問題，一條清楚的導入路線

先說明預期價值，再區分需求、規劃與待驗證項目



先看價值與邊界



再看設計與分工



最後走向落地

1 2 3

01 預期效益

02 正式主機存取邊界

03 需求狀態與目標架構

04 分支與部署策略

05 授權換版與復原設計

06 POC 到正式上線

讓換版不再每次重新摸索

完成導入並通過驗收後，預期帶來三項改善



01

維運更一致

一致流程，少搬檔、少漏步。

人員、時間、主機與版本
可追查。



02

降低操作風險

版本與目標綁定放行。

備份與復原演練，
降低失敗影響。



03

複用到其他專案

留下治理與操作範本。

各專案的服務與復原方式，
仍需個別驗證。

預期改善，不是既有成果；POC / 試辦後再以紀錄比較。

只送檔，也已越過正式主機存取邊界

原方案已否決：建置端不能直接碰正式主機



保留建置自動化；不以共用目錄、帳號或中繼腳本繞過邊界。

先把「需求」與「做得到」分開

官方文件支持工具能力，不代表本案已完成整合或驗收

需求已確認

已確認的需求

保留 GitLab 建置；正式主機僅限指定部門存取。

正式部署須先選定版本與目標、授權放行；送檔也算存取。

做法規劃中

規劃中的做法

以 Azure DevOps Server 管理放行，由目標 Agent 執行受控腳本。

納入備份、健康檢查與復原；需另行實作，並非工具自帶完整機制。

POC 待驗證


POC 待驗證

GitLab 串接、Agent 權限與放行前禁止送檔。

F5 隔離、人工確認、備份還原及失敗停止；含失聯例外。

Windows 正式部署｜端到端目標架構與單機換版


Production 範圍 • GitLab CE → Azure DevOps Server → Windows Targets • 目標設計 / 待 POC 驗證

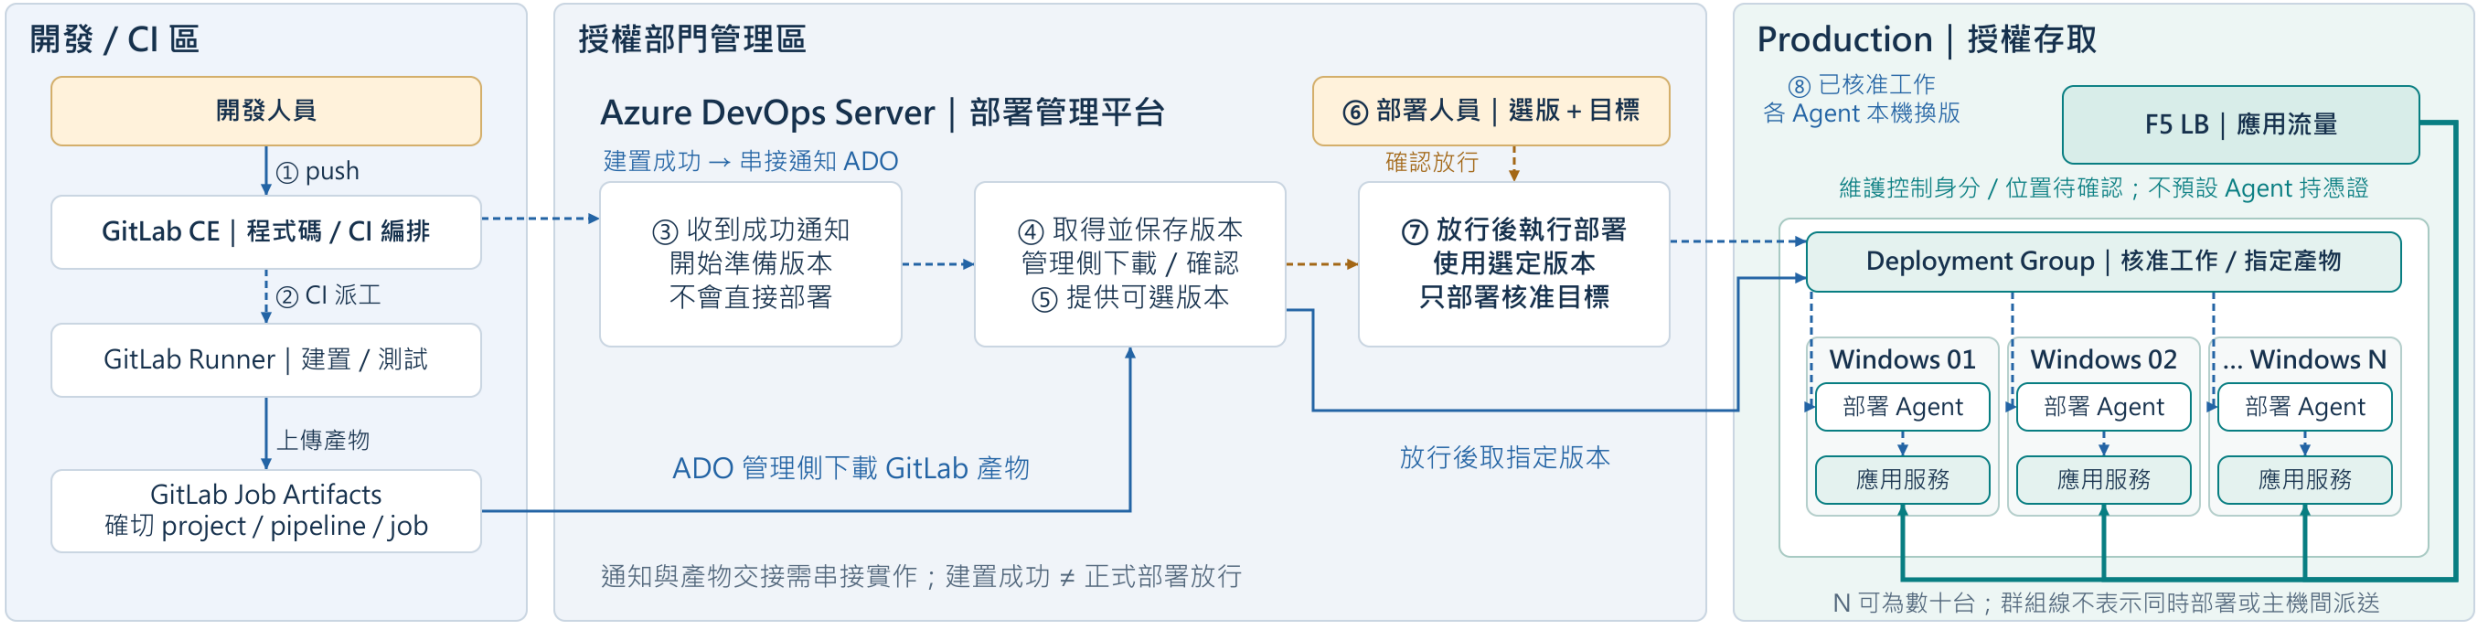

存取界線｜建置與版本匯入不碰正式主機；放行前不得預拷。各 Target Agent 主動連 ADO 取工作，執行已授權的部署。

⑧ 每一核准 Target｜健康且流量恢復，才可結案

建議逐台；失敗暫停後續（需編排）• 批次 / 容量待定

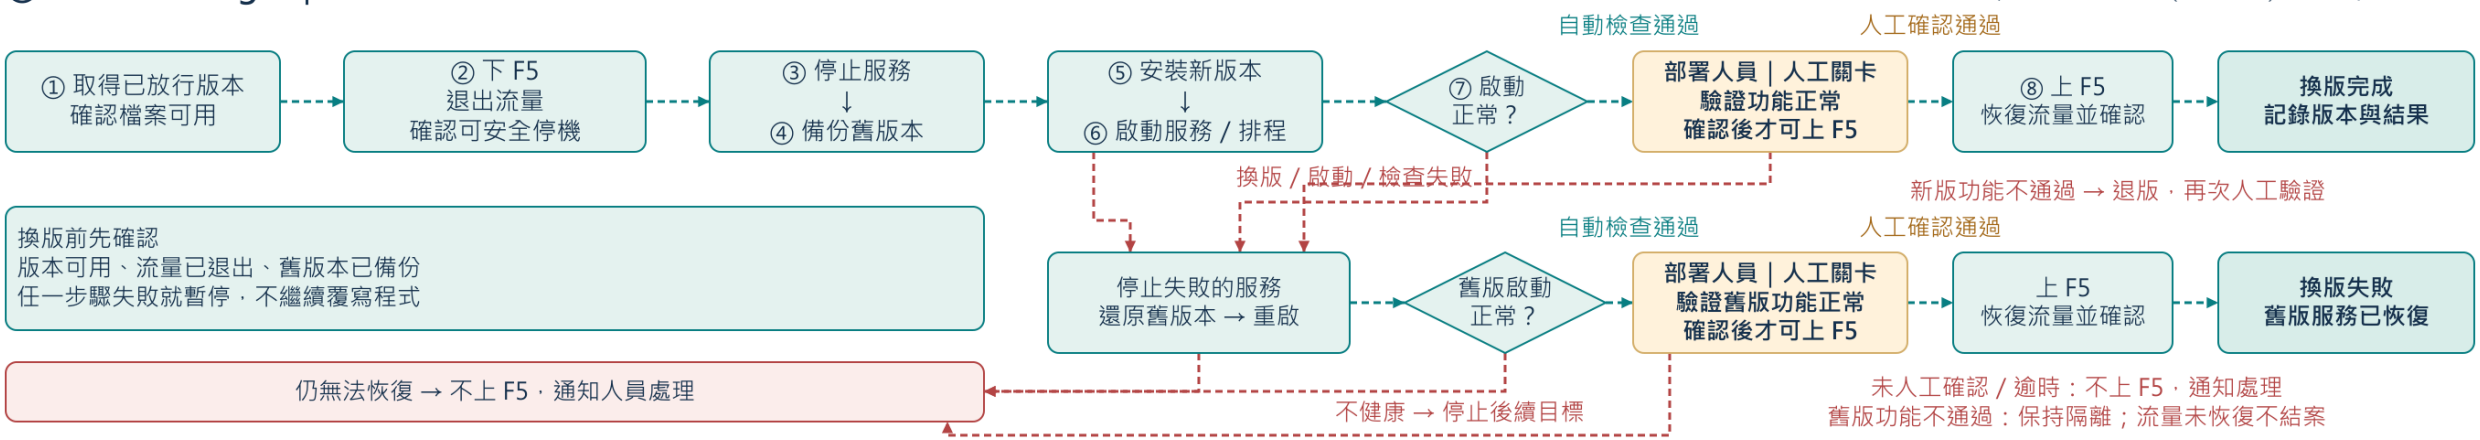

實作前確認｜F5 操作方式、服務正常的判定、備份與還原方式；主機失聯需另行處理，程式退版不等於資料庫還原。

圖例 ⇢ 控制 / 授權（虛線） → 程式碼 / 產物（實線） ⟶ 應用流量（粗線）

分區是責任邊界，非已驗證網段 / ACL • 接收器與部署腳本待實作
可編輯主檔：draw.io；生成器僅初始種子，簡報重建不覆寫手改

不同 branch，各走合適的部署路線


規劃示意 / 待 POC：各分支各自建置；正式部署仍須授權。

來源分支	觸發與策略	執行者	目標環境
master	符合條件自動觸發	Azure DevOps Server + Agent	SIT
pre-production	符合條件自動觸發	Azure DevOps Server + Agent	UAT
production / production-bq1 production-bq2 / production-nh …（平行正式分支示例）	選版 + 選目標 授權放行	Azure DevOps Server + Agent 依目標採不同換版策略	Production

不同分支可有不同 pipeline；不將 production 前綴自動視為已授權。

放行後才送檔，流量恢復前再確認

規劃 / 待 POC：Agent、備份、人工等待與復原腳本均須實作及演練。



換版 / 啟動 / 檢查 / 新版功能驗證失敗

保持隔離 → 還原舊版 → 再檢查


舊版健康且人工確認，才可上 F5。
復原成功仍記為「換版失敗」。

未確認、逾時或復原失敗：不恢復流量

停止後續目標並通知；主機失聯另需復原手段。

從第一個 POC，走向受控的正式上線

暫定里程碑順序；階段日期、資源與上線批准，待相關部門共同確認。

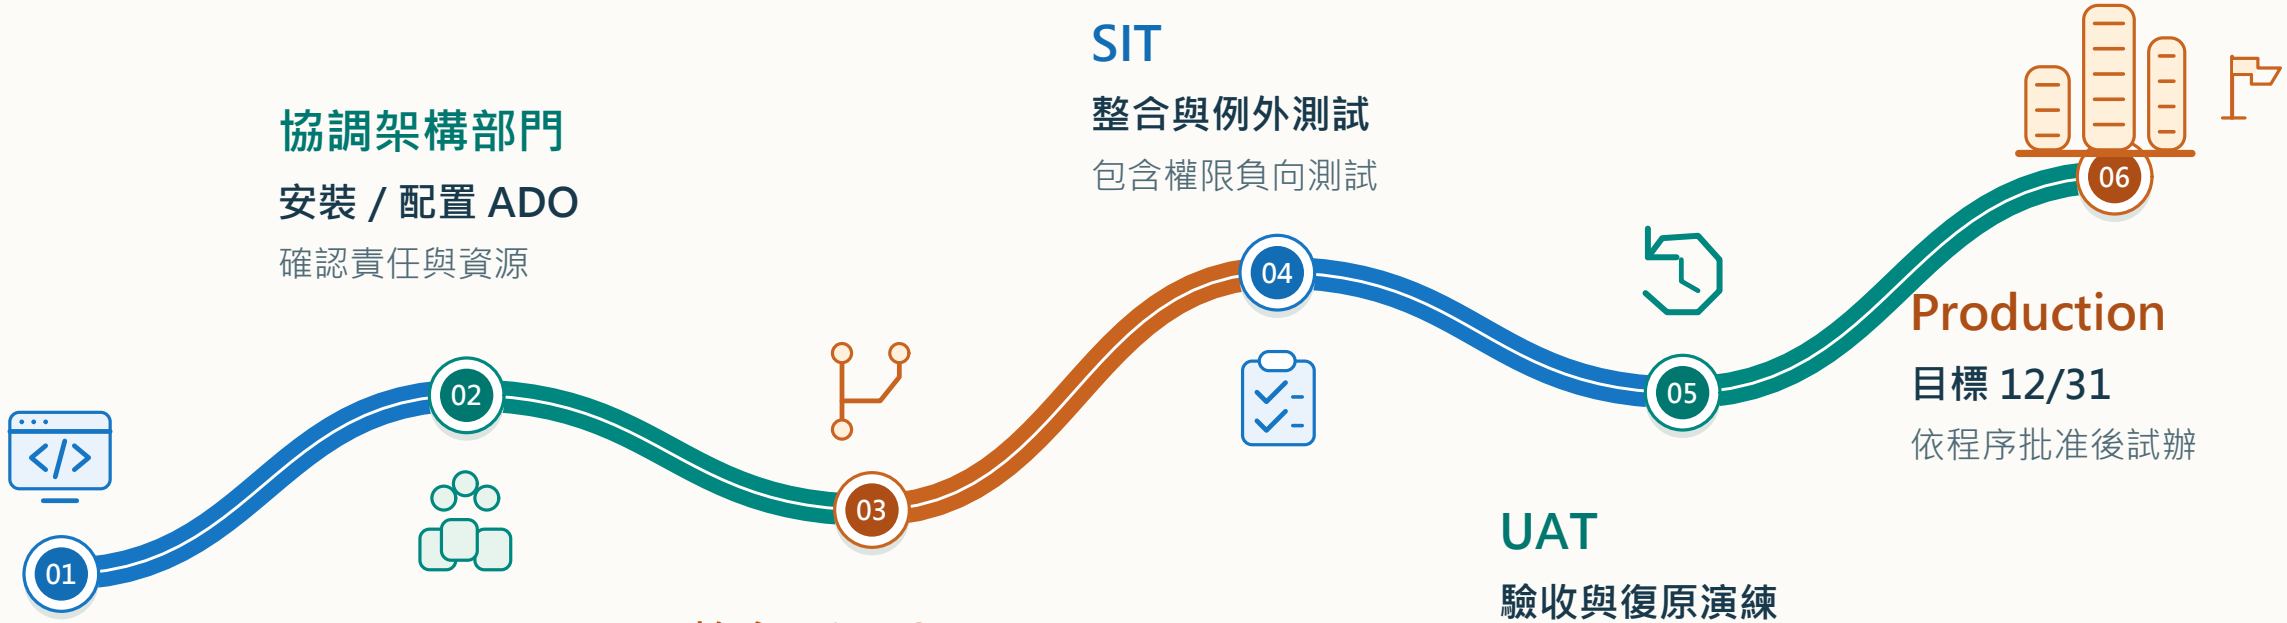

POC

驗證通知與權限

隔離評估環境

協調架構部門

安裝 / 配置 ADO

確認責任與資源

整合 GitLab

串接通知與產物

保留與稽核

SIT

整合與例外測試

包含權限負向測試

UAT

驗收與復原演練

由授權人員驗收

Production

目標 12/31

依程序批准後試辦

逐關通過再上線：先證明「未放行不能送檔」，再完成驗收與復原演練。
