# Windows 正式部署治理計劃

保留 GitLab 建置，讓正式換版由授權部門掌握

## Azure DevOps Server 導入提案

本次為需求與技術方向提案 | 尚未完成實作或 POC 驗證

Express 作為 POC 起點 | 正式版本另行確認

跨部門討論稿 | 目標 12/31，時程待共同確認

# 今天看六件事：效益、邊界、架構、環境、換版與時程

先說明預期價值，再區分需求、規劃與待驗證項目

## 為什麼做

- 01 | 預期效益
- 02 | 正式主機存取邊界

## 規劃怎麼做

- 03 | 需求狀態與目標架構
- 04 | 分支與部署策略

## 如何落地

- 05 | 授權換版與復原設計
- 06 | POC 到正式上線

# 預期效益：維運更一致、風險可控、經驗可複用

完成導入並通過驗收後，預期帶來三項改善

## 維運更一致

- 選版、換版與留存紀錄採一致流程，減少人工搬檔與漏步。
- 可查誰在何時、對哪台主機部署哪個版本，縮短問題追查。

## 降低操作風險


- 版本與目標綁定放行，降低未授權存取與送錯版本風險。
- 備份與復原演練，降低換版失敗的影響。

## 複用到其他專案

- 沉澱權限、交付、放行與紀錄範本，減少重複設計。
- 其他 Windows 專案可沿用框架；服務與復原方式仍須個別驗證。

# 只送檔、不換版，仍然越過正式主機存取邊界

原方案已否決：建置端不能直接碰正式主機

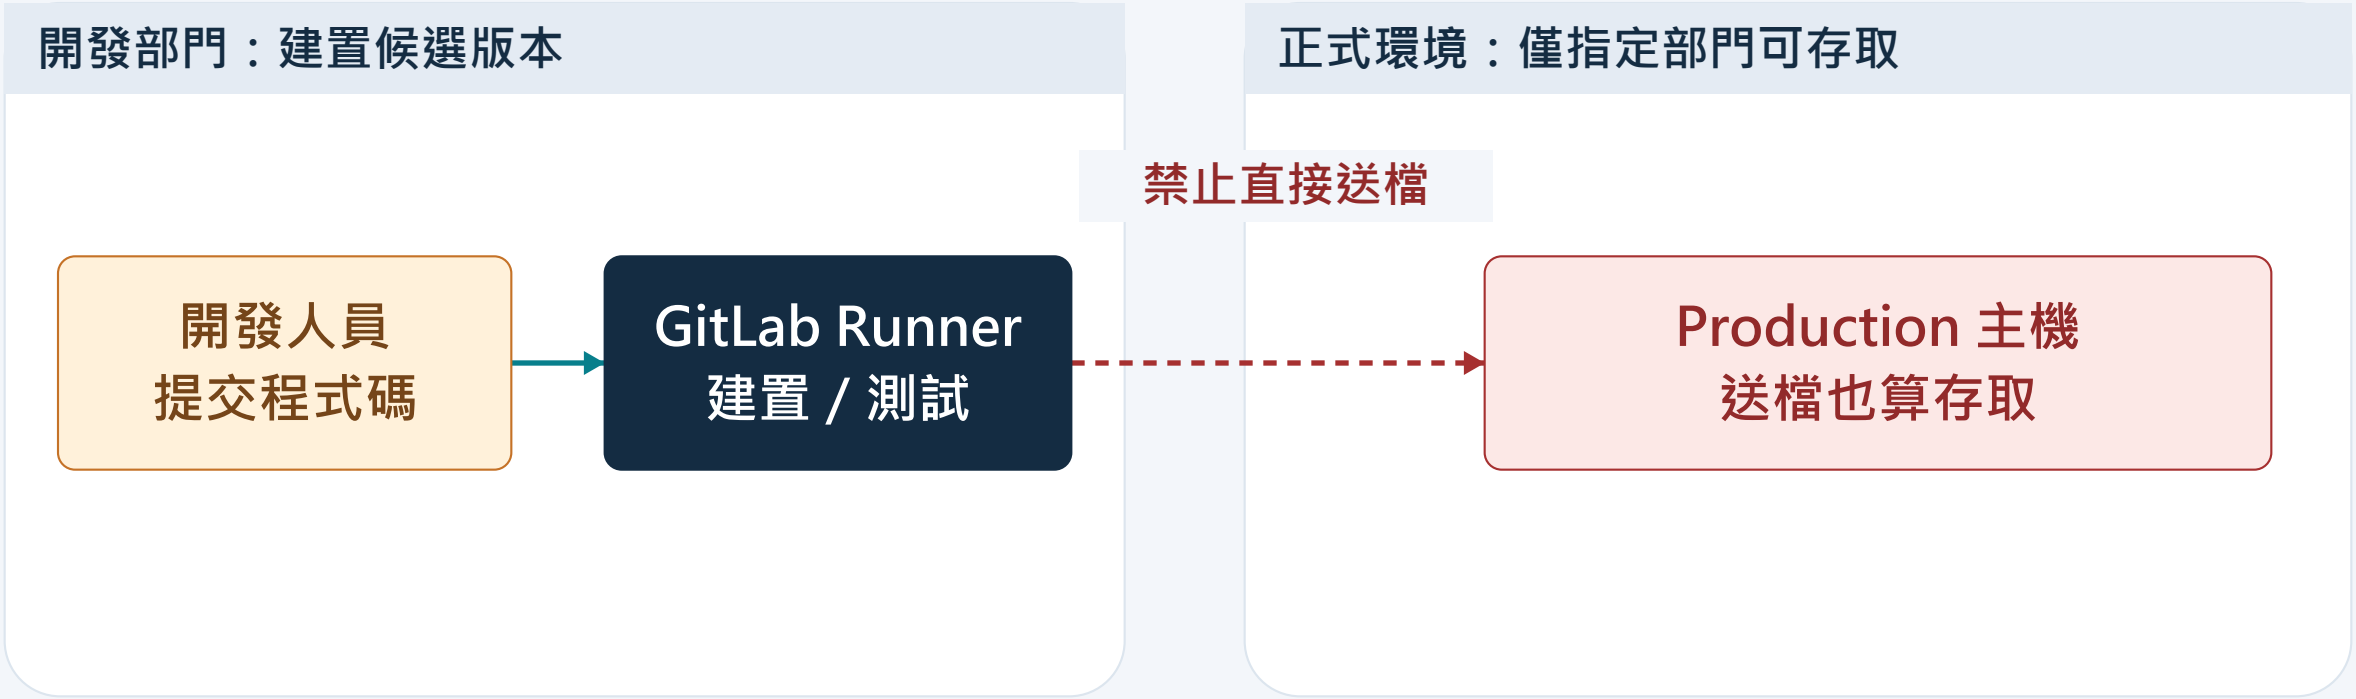


保留建置自動化；檔案送入正式主機與換版，都改由授權流程執行。

# 本次提案狀態：需求已確認，做法仍待驗證

官方文件支持工具能力，不代表本案已完成整合或驗收

## 已確認的需求

- 保留 GitLab 建置；正式主機僅限指定部門存取。
- 正式部署須先選定版本與目標、授權放行；送檔也算存取。

## 規劃中的做法


- 以 Azure DevOps Server 管理放行，由目標 Agent 執行受控腳本。
- 納入備份、健康檢查與復原；需另行實作，並非工具自帶完整機制。

## POC 待驗證

- GitLab 串接、Agent 權限與放行前禁止送檔。
- F5 隔離、人工確認、備份還原及失敗停止；含失聯例外。

# Windows 正式部署｜端到端目標架構與單機換版


Production 範圍 • GitLab CE → Azure DevOps Server → Windows Targets • 目標設計 / 待 POC 驗證

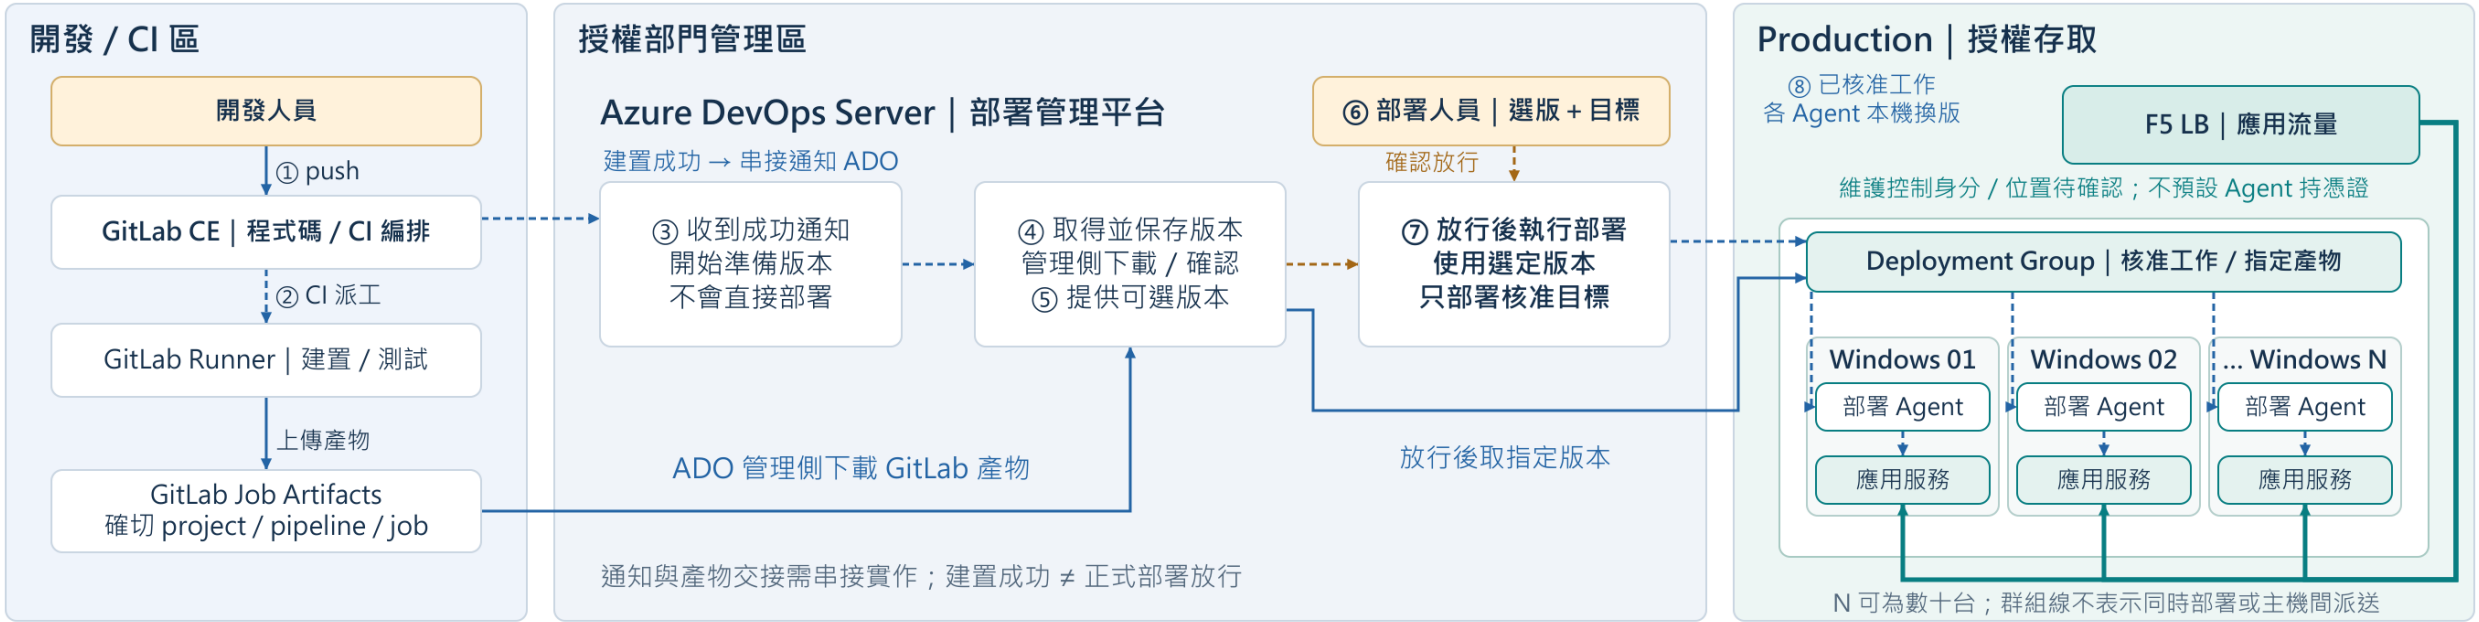


存取界線｜建置與版本匯入不碰正式主機；放行前不得預拷。各 Target Agent 主動連 ADO 取工作，執行已授權的部署。

## ⑧ 每一核准 Target｜健康且流量恢復，才可結案

建議逐台；失敗暫停後續（需編排）• 批次 / 容量待定

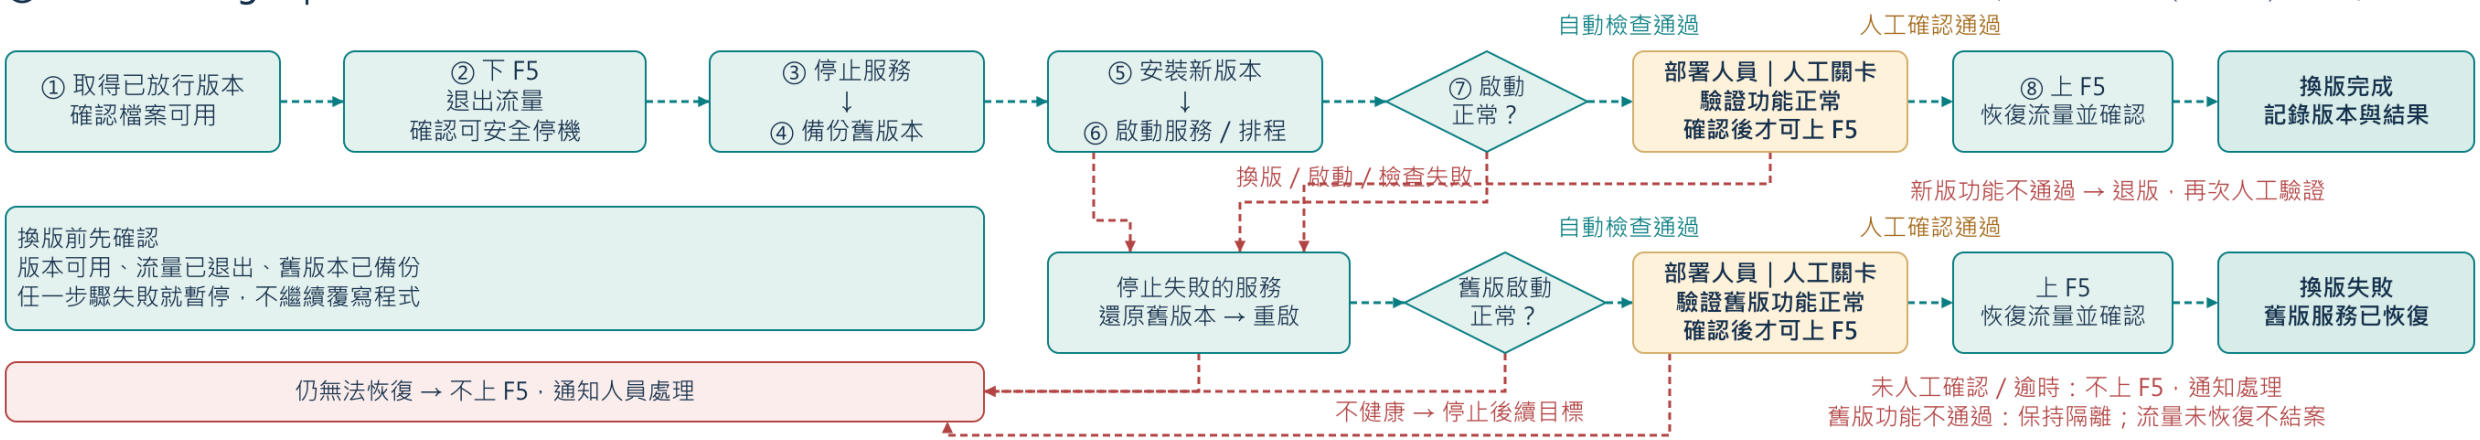



實作前確認｜F5 操作方式、服務正常的判定、備份與還原方式；主機失聯需另行處理，程式退版不等於資料庫還原。

**圖例** ⇢ 控制 / 授權（虛線） → 程式碼 / 產物（實線） ⟶ 應用流量（粗線）

分區是責任邊界，非已驗證網段 / ACL • 接收器與部署腳本待實作
可編輯主檔：draw.io；生成器僅初始種子，簡報重建不覆寫手改

# 規劃做法：不同分支可有不同 CI/CD 與換版方式


規劃示意 / 待 POC：來源分支 → 對應 pipeline → 部署策略

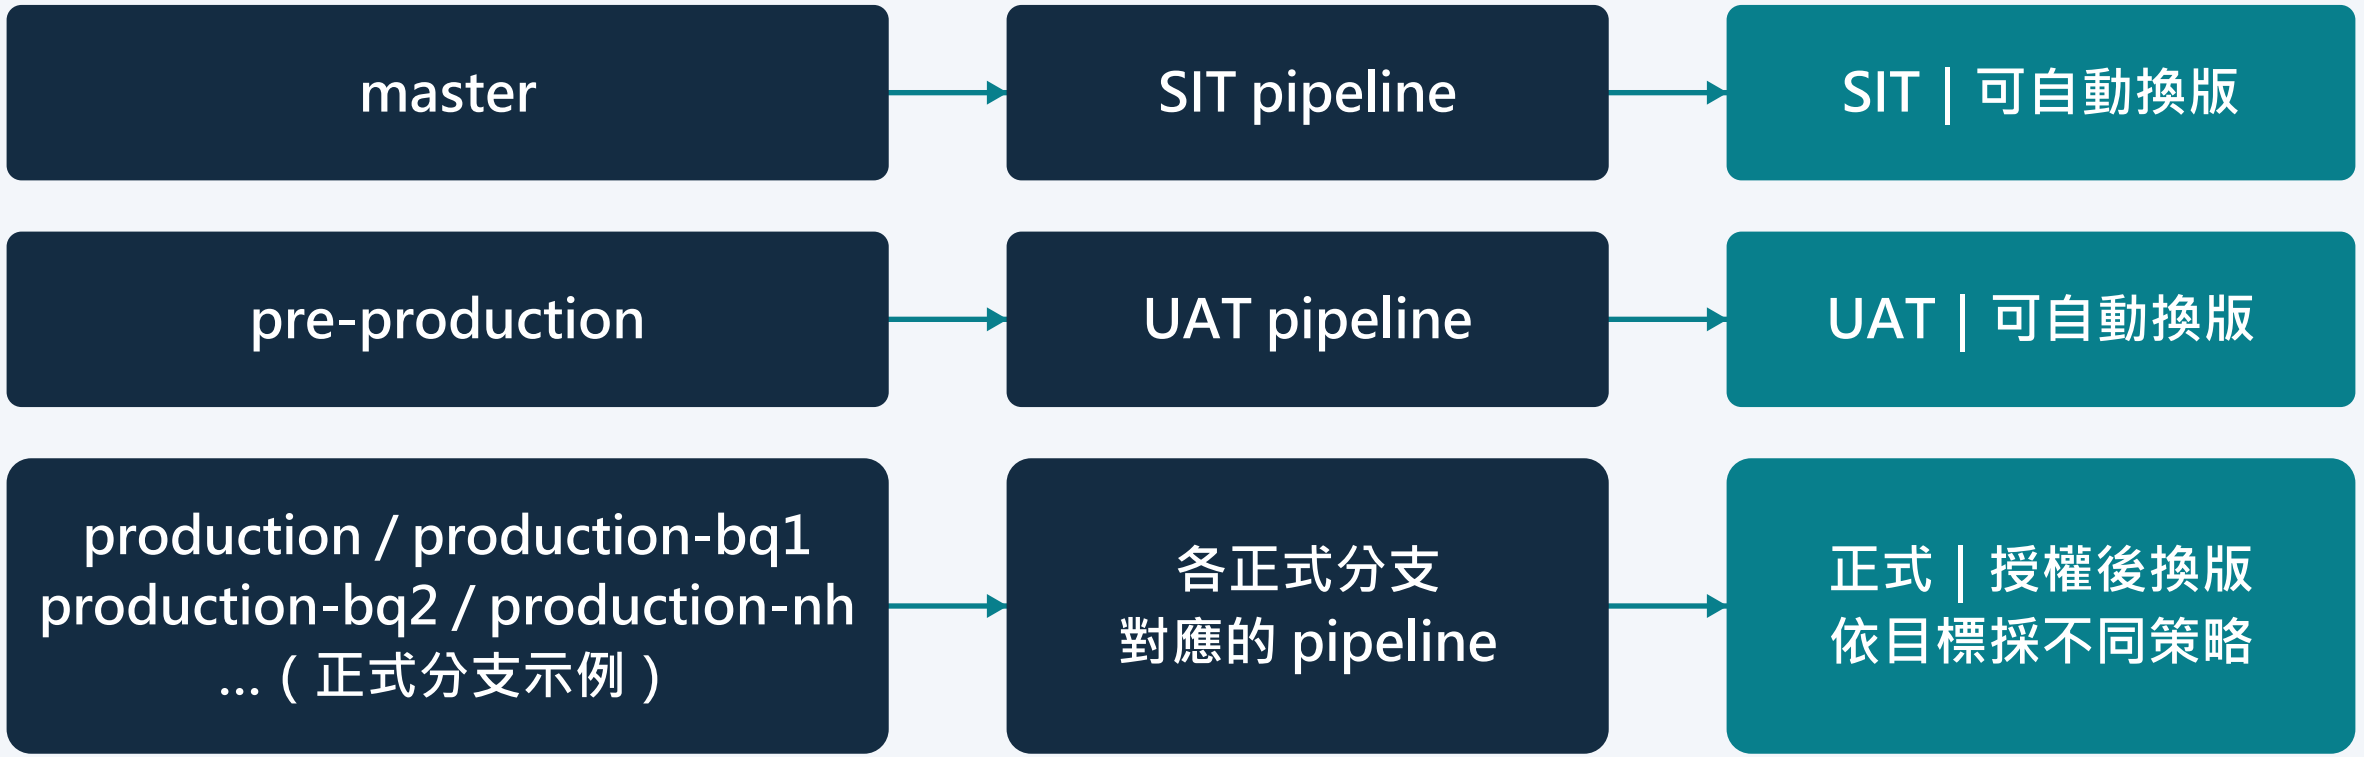


分支可採不同建置、測試、目標與換版機制；正式部署仍須授權。

# 規劃做法：放行後送檔，換版失敗嘗試復原

待 POC：Agent 執行、備份與復原腳本均須實作及演練

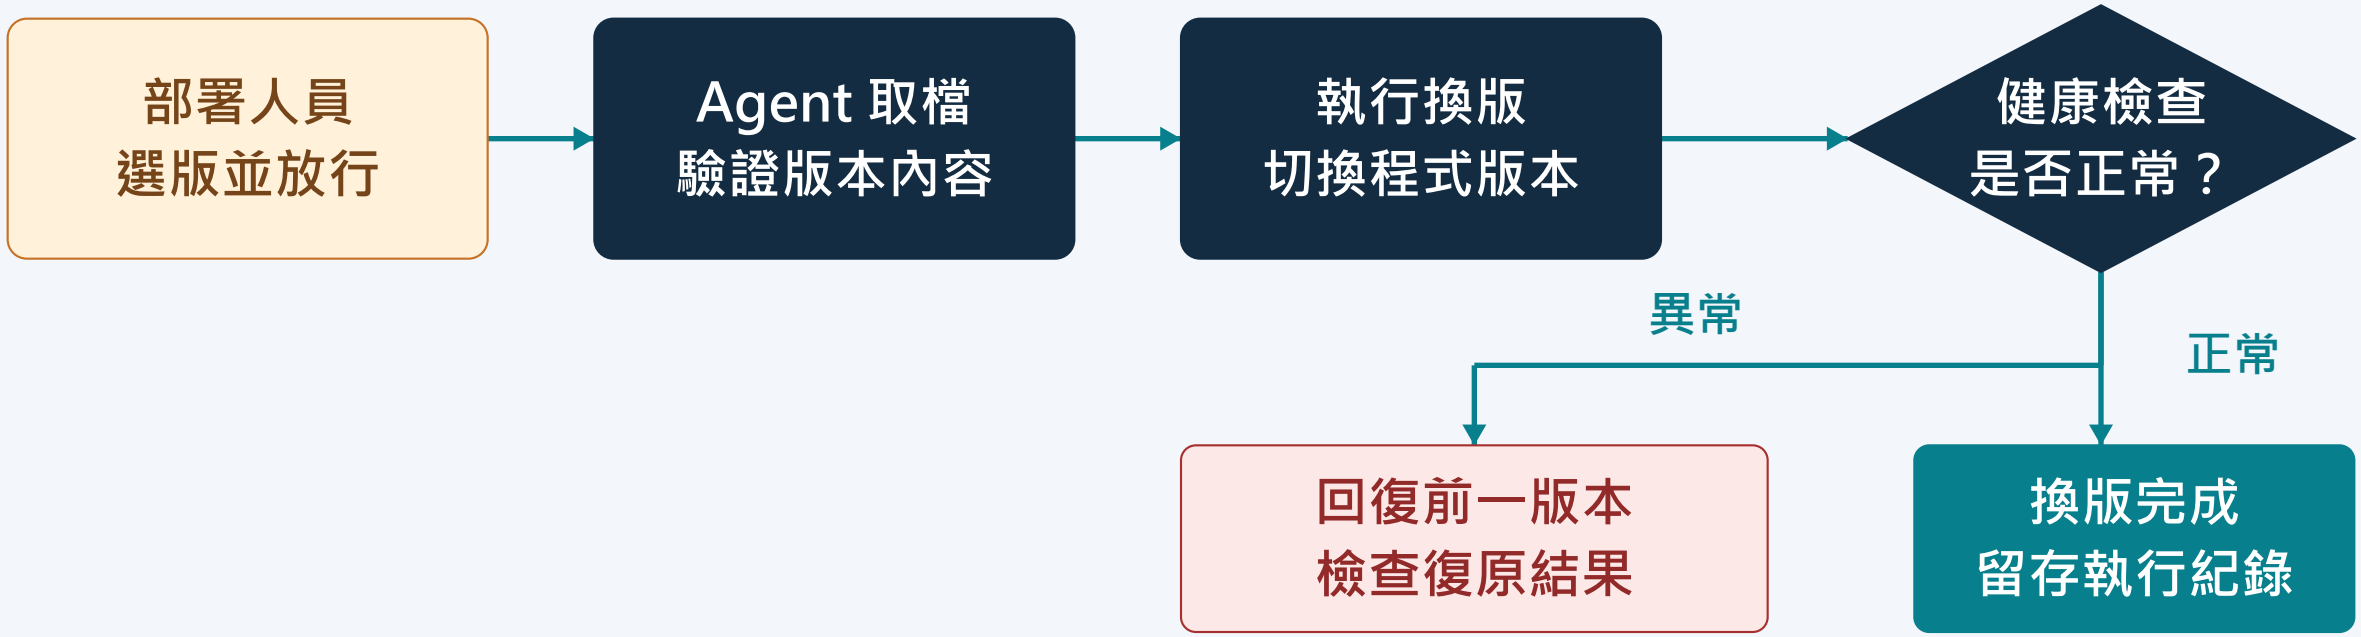


每台主機由部署 Agent 執行受控腳本；記錄人員、版本、目標與結果。

# 建議以 12/31 為目標，逐關驗證後再正式上線

暫定里程碑順序；各階段日期與資源由相關部門共同確認




POC 先證明「未放行不能送檔」；驗收與復原演練通過後，才申請正式上線。
